

# 昭和村新庁舎

## 建設工事が順調に進んでいます

昭和村役場の新庁舎建設は、基本設計・実施設計を基に、令和4年度中の完成を目指し工事が進んでいます。利用者目線に立ち、防災拠点としての役割を担う新庁舎となるよう、整備を進めています。ここでは、建設工事の進み具合についてお知らせします。



▲現在の本庁舎。

工事に先立ち安全祈願祭(地鎮祭)を行いました。▶



上空から見た  
新庁舎建設工事



令和3年7月

更地から工事開始



▲工事に支障となるバス車庫と玄関の一部を解体しました。



令和3年8月

基礎の下にコンクリートを打設



▲西側から基礎を造っていきます。



令和3年9月

基礎工事のための仮設通路設置

### ▼事業全体のスケジュール

年度	工程
令和元年度	基本設計 実施設計
2年度	新庁舎 建設工事
3年度	
4年度	旧庁舎解体 外構工事
5年度	

現在は  
こちら  
庁舎移転



令和3年10月

基礎工事が完了

安全祈願祭

試掘調査

基礎工事





## 工事の進み具合は

昭和村新庁舎建設工事の進捗状況は、村公式ホームページで確認できます。

昭和村新庁舎 進捗 検索



村公式チャンネルで公開中▶



新庁舎建設タイムラプス



令和5年の春をめどに、完成した新庁舎に備品の搬入や情報システムの移設などの引っ越し作業を行い、役場機能を新庁舎に完全移転できるよう、日々作業を進めています。村民のみなさんには、引き続きご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。

完成イメージ




▲空調設備や配管の取り付け。



▲2階床のコンクリート打設。

▼鉄骨建て方工事が終了。その後、建物の周りを足場とシートで囲っています。

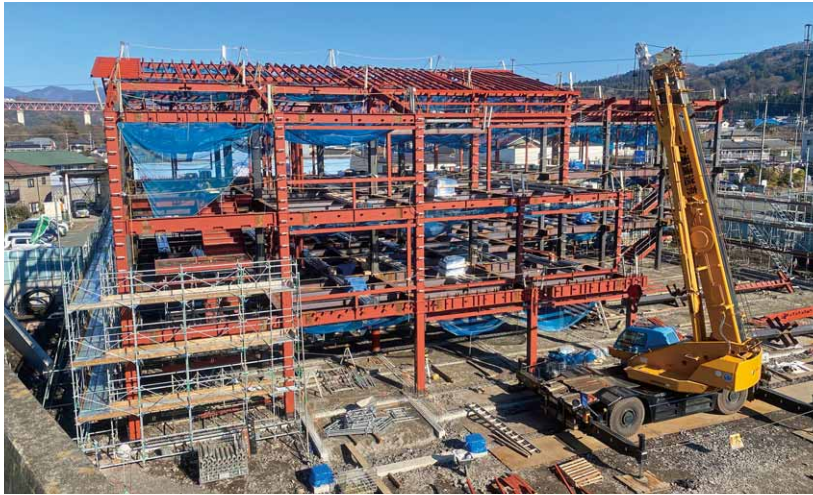

▼鉄骨の施工が徐々に進む。

▼鉄骨組み立て(建て方)を開始。



令和4年4月

屋根材の設置が完了



令和4年1月

屋根に下地と防水シート設置



令和3年12月

鉄骨の組み立てが完了



令和3年11月

基礎のまわりを埋め戻す

外壁・屋根工事

鉄骨建て方
